


Ид. № подл.	Подп. и дата	Взам. упр. №
ИД/0454	20.08.2011	

Ид. № подл. 20.08.2011

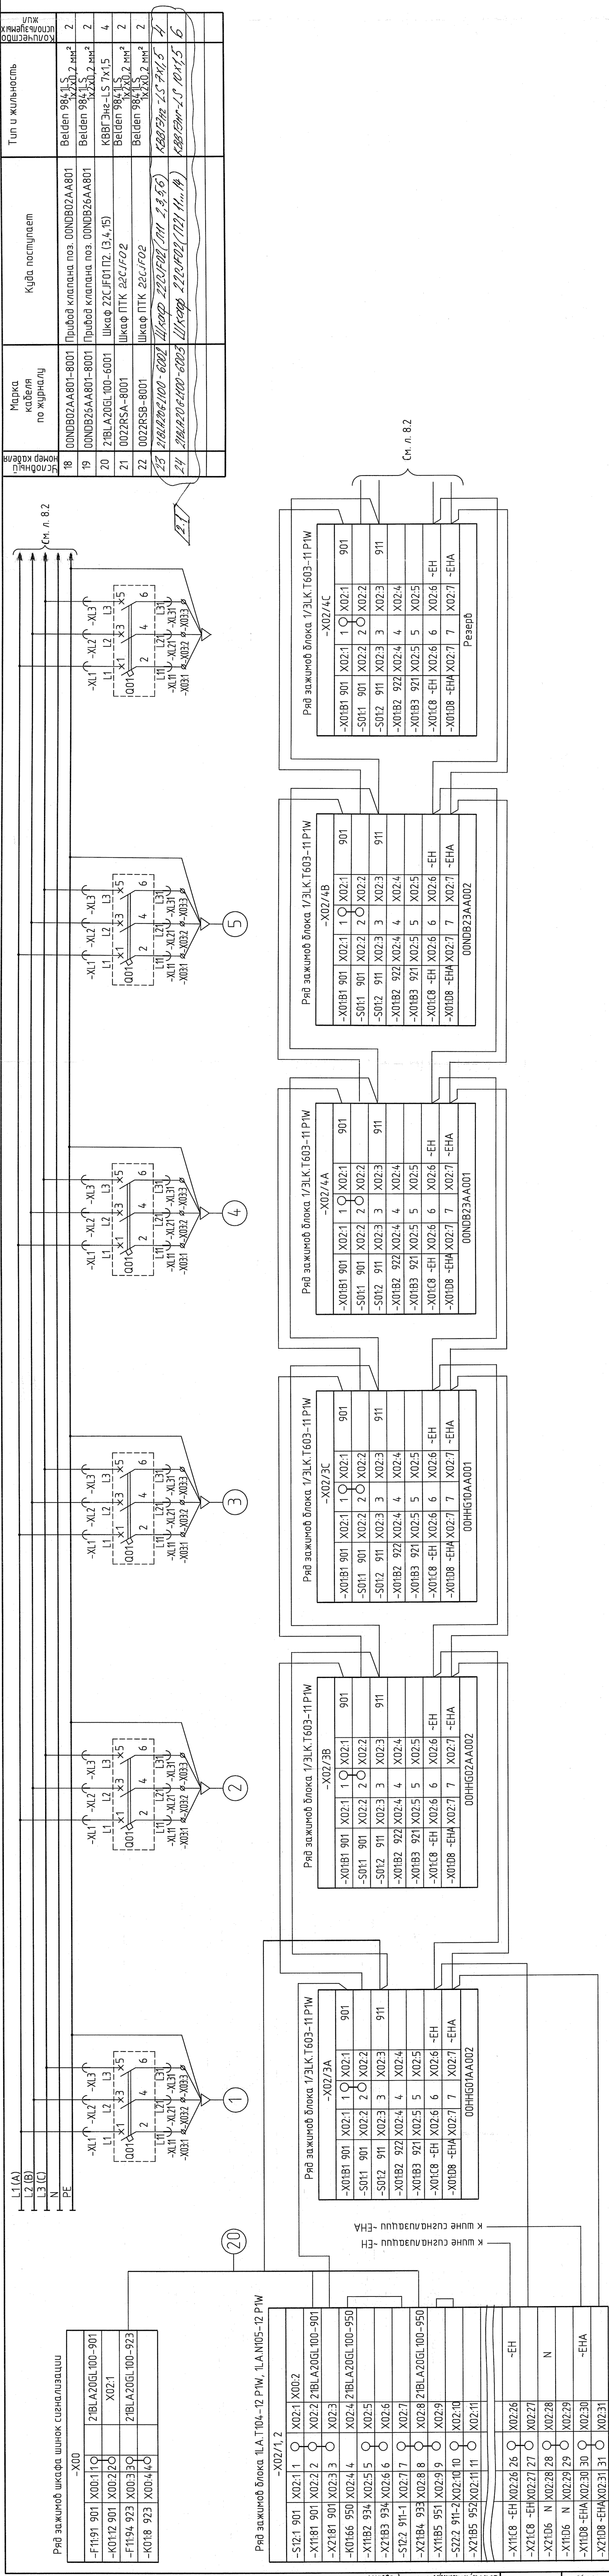

Марка кабеля по журналу	Куба поступаем	Тип и жилность кабеля	Улж хителелер исполнени
1	00NHG01AA002-4001	КВВГ нз-LS 5х2,5	4
2	00NHG02AA002-4001	КВВГ нз-LS 5х2,5	4
3	00NHG10AA001-4001	КВВГ нз-LS 5х2,5	4
4	00NDB23AA001-4001	КВВГ нз-LS 5х2,5	4
5	00NDB23AA002-4001	КВВГ нз-LS 5х2,5	4
6	00NDB24AA001-4001	КВВГ нз-LS 5х2,5	4
7	00NDB24AA002-4001	КВВГ нз-LS 5х2,5	4
8	00NDC01AA001-4001	КВВГ нз-LS 5х2,5	4
9	00NDC01AA002-4001	КВВГ нз-LS 5х2,5	4
10	00NDC01AA003-4001	КВВГ нз-LS 5х2,5	4
11	00NDC01AA004-4001	КВВГ нз-LS 5х2,5	4
12	00NDB26AA001-4001	КВВГ нз-LS 5х2,5	4
13	00NDB02AA001-4001	КТВВ нз-LS 7х1,5	6
14	00NDB26AA001-4001	КТВВ нз-LS 7х1,5	6
15	71SGM10AA001-4001	КВВГ нз-LS 5х2,5	4
16	00CXW11-4001	КВВГ нз-LS 4х2,5	2
17	00CXW07-4001	КВВГ нз-LS 4х2,5	2

Перемычку между рядами зажимов X02/8A и X02/8B проложить кабелем elden 9841LS 1x2x0,2 мм²

ТЕХАРХИВ

1070.01-010-СУ.09									
Строительство ТЭЦ "Академическая"									
2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)									
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов	
2	1	-	2387-14	Лопат.	3/04/14	Общественное оборудование.			
Разраб.	Лидвагина	Л.свд			27.04.14	водоснабжения котельной. Документация по			
Проект	Грузаба	Г.свд			27.04.14	привязке ПТК к полевым широты			
Гл. спец.	Грузаба	Г.свд			27.04.14		Р	8.1	Э
Н. контр.	Кисляшина				27.04.14	Сборка КРУЗА П 21ВЛАЗ021-100.	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "АКАДЕМИЧЕСКАЯ" Дирекция по проектированию объектов генерации		
На ч.отд.	Веринякова				27.04.14	Схема электрическая подключения			
